

INVITALIA

Infratel Italia SpA

# Piano Bul in aree Bianche

Incontro del 05/02/2019

# Agenda

Orario	Argomento	Relatori
11:15	Soft Coffee Break	
11:30	Saluti e Apertura dei lavori	<b>M. Dècina</b>
11:40 – 12:30	Stato di avanzamento Grande Progetto BUL	<b>D. Tudini S. Lombardo</b>
12:30 – 13:00	Confronto su tematiche rilevanti del Progetto	<b>Interventi dei partecipanti</b>
13:00	<i>Light Lunch</i>	
	II° SESSIONE	
14:15 – 14:40	Intervento del Consigliere Giuridico per le Comunicazioni e l'innovazione digitale del Ministro dello Sviluppo Economico	<b>M. Bellezza</b>
14:40 - 14.50	<i>Saluti del Presidente di Open Fiber</i>	<b>F. Bassanini</b>
14.50 – 15.30	Pianificazione Interventi Open Fiber	<b>E.Ripa S.Paggi</b>
15.30 – 16.00	Domande e Risposte	<b>Interventi dei partecipanti</b>
16.30	<i>Conclusioni</i>	<b>Infratel e Mise</b>

Infratel Italia SpA

**GARA 1 E GARA 2: comuni**

Regione	Fase 1	Fase 2	Fase 3	Fase 4	Totale complessivo
Abruzzo	21	71	31	70	193
Basilicata	30	101			131
Campania	33	54	117	342	546
Emilia-Romagna	83	77	80	100	340
Friuli-Venezia Giulia	81	35	45	55	216
Lazio	81	40	120	128	369
Liguria	72	81	23	59	235
Lombardia	73	193	375	875	1516
Marche	73	62	36	64	235
Molise	18	39	28	51	136
Piemonte	133	275	317	481	1206
Sicilia	60	80	65	185	390
Toscana	73	62	72	62	269
Trentino-Alto Adige	35	45	53	84	217
Umbria	35	36	12	10	93
Valle d'Aosta	74				74
Veneto	151	108	145	175	579
<b>Totale complessivo</b>	<b>1126</b>	<b>1359</b>	<b>1519</b>	<b>2741</b>	<b>6745</b>



Legenda	
<span style="color: green;">■</span>	GARA 1
<span style="color: orange;">■</span>	GARA 2
<span style="color: blue;">■</span>	GARA 3
<span style="color: red;">■</span>	P.A. di Bolzano


**GARA 3**

Regioni	comuni	UI (.000)	Prezzo Aggiudicazione
CALABRIA	365	166	29.176.077,00 €
PUGLIA	245	48	34.457.761,00 €
SARDEGNA	272	331	39.537.040,00 €
<b>TOTALE</b>	<b>882</b>	<b>545</b>	<b>103.170.878,00 €</b>

## Progetti definitivi



*I 302 progetti definitivi devono essere riconsegnati a causa di errori di progettazione evidenziati in fase di verifica*



103 comuni sono stati congelati dopo l'approvazione

## Progetti Esecutivi



**Il 17% dei cantieri avviati sono stati successivamente sospesi**

## Stato dei Progetti Definitivi Fibra Ottica

Regione	Comuni a Piano	Comuni Congelati	%	Progetti da consegnare	%	Progetti Consegnati	%
Abruzzo	193	22	11%	4	2%	167	87%
Basilicata	131	28	21%	2	2%	101	77%
Campania	546	107	20%	26	5%	413	76%
Emilia-Romagna	340	97	29%	37	11%	206	<b>61%</b>
Friuli-Venezia Giulia	216	41	19%	0	0%	175	81%
Lazio	369	39	11%	42	11%	288	78%
Liguria	235	36	15%	7	3%	192	82%
Lombardia	1516	329	22%	122	8%	1065	70%
Marche	235	15	6%	36	15%	184	78%
Molise	136	4	3%	4	3%	128	94%
Piemonte	1206	141	12%	87	7%	978	81%
Sicilia	390	74	19%	20	5%	296	76%
Toscana	269	55	20%	30	11%	184	68%
Trentino-Alto Adige	217	12	6%	4	2%	201	<b>93%</b>
Umbria	93	12	13%	8	9%	73	78%
Valle d'Aosta	74	9	12%	0	0%	65	88%
Veneto	579	128	22%	2	0%	449	78%
<b>Totale</b>	<b>6745</b>	<b>1149</b>	<b>17%</b>	<b>431</b>	<b>6%</b>	<b>5165</b>	<b>77%</b>


Regione	Progetti Definitivi Approvati	% sui progetti presentati	Progetti in verifica	% sui progetti presentati	Esecutivi Approvati	Cantieri in Corso
Abruzzo	105	63%	60	36%	<b>89</b>	<b>82</b>
Basilicata	100	99%	11	11%	<b>30</b>	<b>30</b>
Campania	320	77%	181	44%	<b>54</b>	<b>54</b>
Emilia-Romagna	184	89%	83	40%	<b>65</b>	<b>64</b>
Friuli-Venezia Giulia	154	88%	36	21%	<b>38</b>	<b>38</b>
Lazio	273	95%	13	5%	<b>108</b>	<b>108</b>
Liguria	66	34%	158	82%	<b>14</b>	<b>12</b>
Lombardia	633	59%	702	66%	<b>115</b>	<b>114</b>
Marche	173	94%	21	11%	<b>49</b>	<b>40</b>
Molise	62	48%	56	44%	<b>48</b>	<b>41</b>
Piemonte	714	73%	306	31%	<b>149</b>	<b>132</b>
Sicilia	229	77%	120	41%	<b>91</b>	<b>90</b>
Toscana	175	95%	19	10%	<b>62</b>	<b>60</b>
Trentino-Alto Adige	148	74%	56	28%	<b>8</b>	<b>8</b>
Umbria	70	96%	12	16%	<b>42</b>	<b>34</b>
Valle d'Aosta	65	100%	0	0%	<b>7</b>	<b>7</b>
Veneto	365	81%	148	33%	<b>86</b>	<b>84</b>
<b>Totale</b>	<b>3836</b>	<b>74%</b>	<b>1982</b>	<b>38%</b>	<b>1055</b>	<b>998</b>

## Stato dei Progetti Fibra Ottica

REGIONE	UI a Piano	UI Approvate	UI in Corso	%
Abruzzo	209.041	196.680	95.341	<b>48%</b>
Basilicata	65.677	88.309	28.502	32%
Campania	332.497	413.818	127.718	31%
Emilia-Romagna	549.054	482.384	135.383	28%
Friuli-Venezia Giulia	223.524	156.995	24.244	15%
Lazio	384.334	365.830	147.490	40%
Liguria	204.558	203.545	7.899	4%
Lombardia	1.400.158	1.310.971	289.273	22%
Marche	345.419	328.998	66.618	20%
Molise	132.396	130.408	43.442	33%
Piemonte	830.831	843.569	145.579	17%
Sicilia	357.190	426.554	156.595	37%
Toscana	463.233	351.160	97.863	28%
Trentino-Alto Adige	228.187	235.456	7.593	<b>3%</b>
Umbria	122.339	116.826	37.733	32%
Valle d'Aosta	62.269	78.679	5.506	7%
Veneto	827.504	734.223	122.927	17%
<b>TOTALE</b>	<b>6.738.211</b>	<b>6.464.405</b>	<b>1.539.706</b>	<b>24%</b>

Nelle UI a piano non sono incluse le UI aggiuntive ma includono le UI dei comuni congelati

## Progetti definitivi



## Progetti Esecutivi per siti FWA (ca 12000)



Infratel Italia SpA

Regione	Comuni a Piano	Comuni Congelati	%	Progetti da consegnare	%	Progetti Consegnati	%
Abruzzo	189	19	10%	0	0%	170	90%
Basilicata	131	29	22%	0	0%	102	78%
Campania	545	104	19%	0	0%	441	81%
Emilia-Romagna	337	88	26%	0	0%	249	74%
Friuli-Venezia Giulia	214	38	18%	0	0%	176	82%
Lazio	369	39	11%	0	0%	330	89%
Liguria	232	35	15%	0	0%	197	85%
Lombardia	1510	314	21%	0	0%	1196	79%
Marche	234	14	6%	1	0%	219	94%
Molise	136	4	3%	0	0%	132	97%
Piemonte	1203	142	12%	1	0%	1060	88%
Sicilia	390	73	19%	0	0%	317	81%
Toscana	267	46	17%	0	0%	221	83%
Trentino-Alto Adige	215	11	5%	3	1%	201	93%
Umbria	92	11	12%	0	0%	81	88%
Valle d'Aosta	74	9	12%	0	0%	65	88%
Veneto	571	117	20%	7	1%	447	78%
<b>Totale</b>	<b>6709</b>	<b>1093</b>	<b>16%</b>	<b>12</b>	<b>0,18%</b>	<b>5604</b>	<b>84%</b>

Regione	Progetti Approvati	%	Progetti in verifica	%	Esecutivi Approvati	%	Cantieri in Corso
Abruzzo	136	80%	34	20%	10	7%	9
Basilicata	60	59%	42	41%	10	17%	10
Campania	73	17%	368	83%	20	27%	20
Emilia-Romagna	183	73%	66	27%	35	19%	15
Friuli-Venezia Giulia	99	56%	77	44%	9	9%	1
Lazio	147	45%	183	55%	28	19%	15
Liguria	1	1%	196	99%	1	100%	1
Lombardia	554	46%	642	54%	62	11%	42
Marche	55	25%	165	75%	8	15%	4
Molise	114	86%	18	14%	7	6%	7
Piemonte	496	47%	565	53%	26	5%	21
Sicilia	120	38%	197	62%	45	38%	45
Toscana	184	83%	37	17%	17	9%	10
Trentino-Alto Adige	48	24%	156	78%	1	2%	0
Umbria	43	53%	38	47%	15	35%	5
Valle d'Aosta	65	100%	0	0%	1	2%	1
Veneto	327	73%	127	28%	40	12%	37
<b>Totale</b>	<b>2705</b>	<b>48%</b>	<b>2911</b>	<b>52%</b>	<b>335</b>	<b>12%</b>	<b>243</b>

**Fibra Ottica**


Regione	Ordini di esecuzione
Abruzzo	26.736.312,80 €
Basilicata	10.425.746,81 €
Campania	32.915.928,73 €
Emilia-Romagna	64.955.775,52 €
Friuli-Venezia Giulia	9.614.853,65 €
Lazio	57.394.840,46 €
Liguria	3.283.150,36 €
Lombardia	68.650.944,56 €
Marche	29.839.831,64 €
Molise	13.292.162,27 €
Piemonte	47.258.722,33 €
Sicilia	38.116.854,02 €
Toscana	48.961.798,77 €
Trentino-Alto Adige	1.235.077,75 €
Umbria	29.095.393,92 €
Valle d'Aosta	1.269.532,90 €
Veneto	39.652.641,89 €
<b>Totale complessivo</b>	<b>522.699.568,38 €</b>

**FWA**

Regione	Ordini di esecuzione
Abruzzo	244.410,00 €
Basilicata	480.081,03 €
Campania	916.518,33 €
Emilia-Romagna	1.857.251,98 €
Friuli-Venezia Giulia	240.950,76 €
Lazio	1.405.157,32 €
Liguria	40.249,35 €
Lombardia	1.788.029,00 €
Marche	304.238,48 €
Molise	171.087,00 €
Piemonte	1.086.732,45 €
Sicilia	1.943.745,64 €
Toscana	802.064,00 €
Trentino-Alto Adige	40.158,46 €
Umbria	608.476,96 €
Valle d'Aosta	120.748,05 €
Veneto	2.361.468,00 €
<b>Totale complessivo</b>	<b>14.411.366,81 €</b>

**Totale (VA) ordinato 537.110.935,19 €**

### Ordini Emessi per Mese

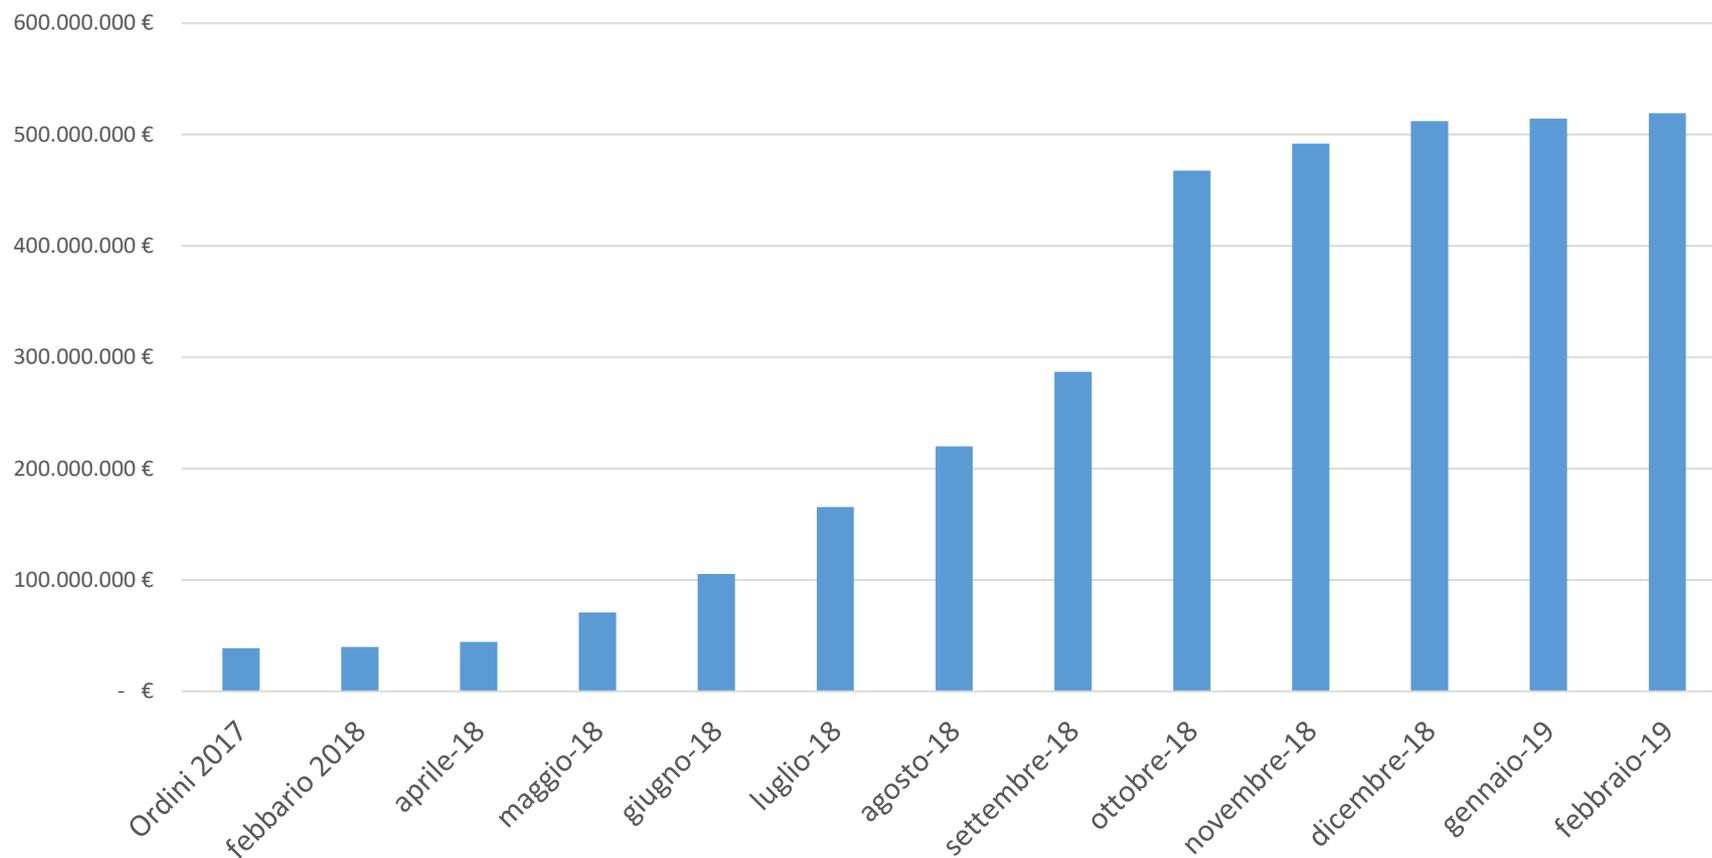


Regioni	Sal approvati
Abruzzo	8.507.883,36 €
Basilicata	6.378.315,00 €
Campania	11.745.959,58 €
Emilia-Romagna	27.133.912,17 €
Friuli-Venezia Giulia	2.299.945,82 €
Lazio	21.331.683,54 €
Liguria	717.518,23 €
Lombardia	16.325.387,62 €
Marche	7.536.385,20 €
Molise	4.861.669,87 €
Piemonte	10.762.535,00 €
Sicilia	18.818.665,24 €
Toscana	18.116.340,89 €
Trentino-Alto Adige	99.491,86 €
Umbria	7.340.056,21 €
Valle d'Aosta	68.091,38 €
Veneto	13.286.087,19 €
<b>Totale</b>	<b>175.329.928,16 €</b>

Il dato è riferito ai SAL approvati dal RUP di Infratel al 28/02/2019


- Successivamente all'approvazione del regime di Aiuto di Stato si è reso necessario notificare il «**National Major Project Ultra Broadband - White Areas**»
- Con l'assistenza tecnica di JASPERS **Infratel ha condotto l'Analisi Costi-Benefici e lo Studio di fattibilità**
- La **Completion Note** di JASPERS è stata emessa a luglio 2017
- **Prima notifica** alla Commissione Europea in data 7 settembre 2017 (versione 1.0)
  - A questa ha fatto seguito un'interazione con la Commissione con una serie di riunioni e lettere di richieste di chiarimenti (tra settembre 2017 e dicembre 2018), cui sono seguite rielaborazioni successive del Grande Progetto
- Il **Grande Progetto (attualmente alla versione 1.3, concordata con i rappresentanti della CE), è pronto per la notifica finale, e sarà approvato dalla Commissione il 1° Aprile nell'ambito di un evento dedicato ai 15 Grandi Progetti più importanti**
- **Ammissibilità dell'IVA:** l'Italia presenterà l'IVA tra i costi ammissibili, se la Commissione dovesse rettificare l'importo del GP stralciando l'IVA, il Governo avvierà un ricorso nelle sedi competenti.

**1**



**Apertura di 2000 Nuovi Cantieri**

**2**



**500 Collaudi**

**3**



**Avvio vendita dei Servizi ai Cittadini  
nei comuni collaudati**
